

令和6年能登半島地震 応急復旧隊派遣

1 概要

- 令和6年能登半島地震の発生を受け、石川県七尾市において日本水道協会の要請に基づき水道管路の応急復旧活動を行ったもの。

【活動期間】

第1陣： 漏水調査班…R6.2.3（土）～2.12（月） 修繕班…R6.2.6（火）～2/12（月）



第2陣： 漏水調査班…R6.2.9（金）～2.19（月） 修繕班…R6.2.11（日）～2/18（日）

【派遣人員】

帯広市水道課 4名 幕別町水道課 1名 帯広管工事業協同組合 15名（次頁名簿のとおり）

石川県七尾市

- 人口…48,015人（R6.1末）
- 世帯数…21,650世帯（R6.1末）
- 2/2時点断水戸数…14,200戸

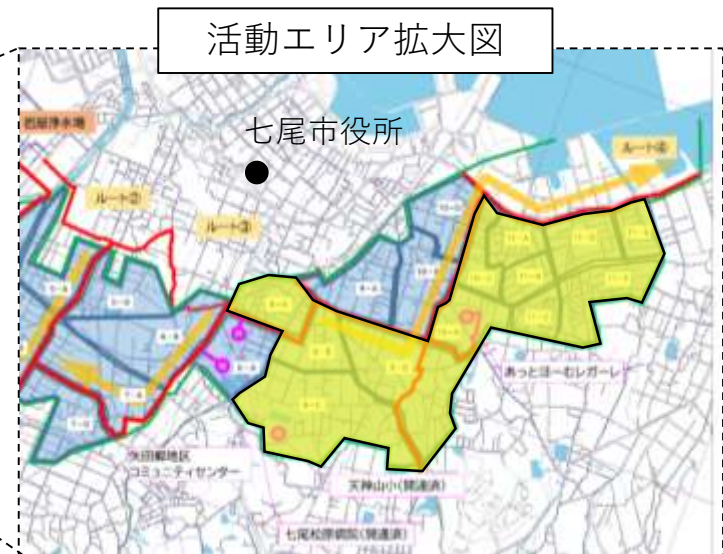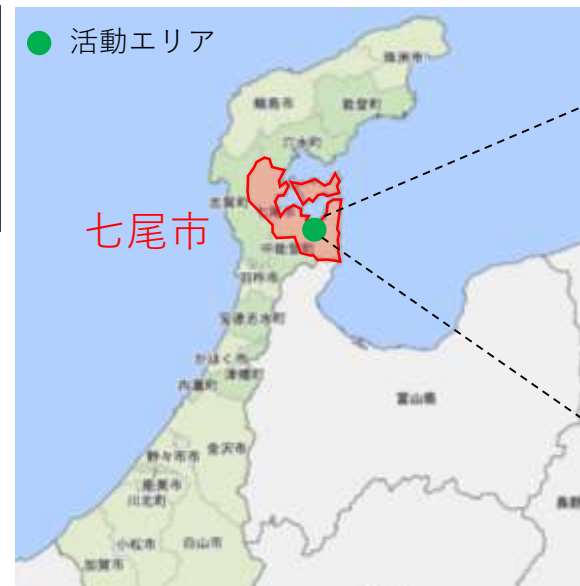

北海道地方支部担当

令和6年能登半島地震 応急復旧隊派遣

2 活動内容 1

- (1) 漏水調査・水の流れを音聴棒（耳で聴き取る器具）を使用し、水道管からの漏水の有無を調査。
- ・活動期間中、**6箇所**の漏水を確認。



災害対策本部



漏水調査（現地踏査）



漏水調査（音聴棒）

漏水調査状況



漏水調査 (音聴棒)



漏水箇所

令和6年能登半島地震 応急復旧隊派遣

2 活動内容2

(2) 修繕班

- ・漏水調査で確認した破損箇所を切り取って繋ぎ直すことなどにより、漏水箇所の修理を実施。
- ・活動期間中、7箇所の修理を実施。



漏水箇所特定



舗装切断



掘削

漏水修理工況



漏水箇所



漏水箇所



修理完了
